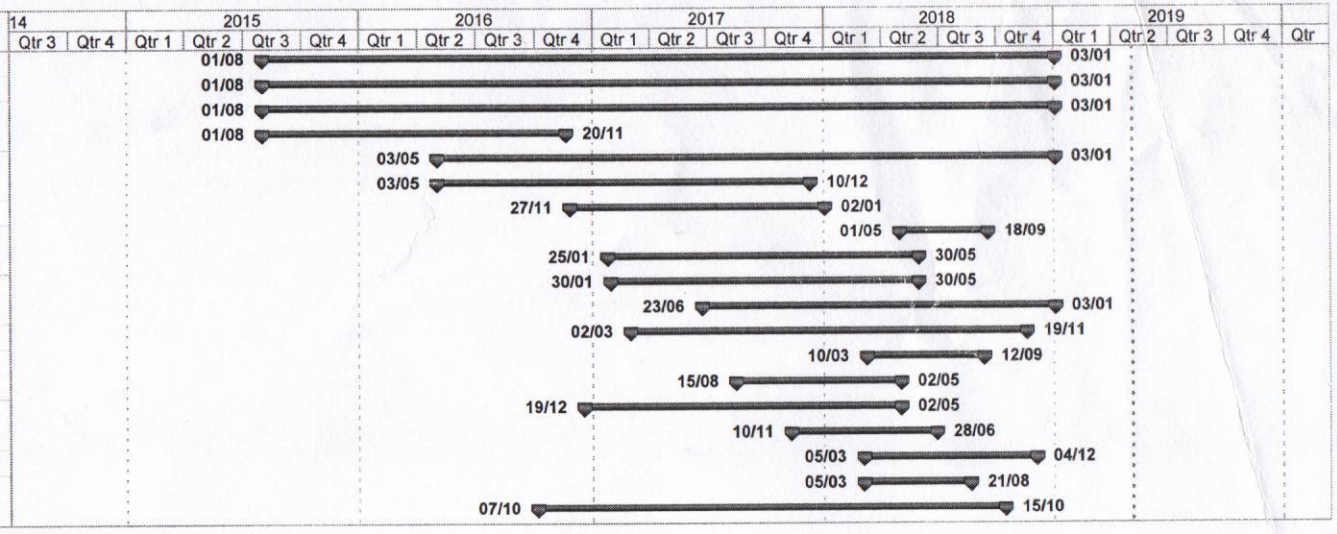ID	Task Name	Start	Finish
1	Alipore Project	01/08	03/01
2	Works related to Buildings	01/08	03/01
3	New Block	01/08	03/01
4	Sub-structure	01/08	20/11
18	Super Structure	03/05	03/01
19	RCC Work	03/05	10/12
62	Block Work	27/11	02/01
76	Carpantry Work	01/05	18/09
105	Plastering Work	25/01	30/05
121	Aluminium Window Frame Fixing	30/01	30/05
135	Internal Pop and painting Work	23/06	03/01
151	Flooring Work	02/03	19/11
208	False Ceiling Work	10/03	12/09
224	Internal Sanitary & Plumbing Work	15/08	02/05
238	Internal Electrical works	19/12	02/05
252	Lift Work	10/11	28/06
255	MS Work	05/03	04/12
259	Miscellenious Works related to Building	05/03	21/08
266	Infrastructural Work	07/10	15/10
